



Vector

L'IA planifie.
Toi tu accomplis

GUIDE POUR SOLOPRENEURS

LA MÉTHODE EN 5 ÉTAPES

Le système anti-surprise

Pour solopreneurs qui jonglent plusieurs projets et veulent arrêter de finir leurs mois en mode urgence.



PAR **VECTOR** · L'IA PLANIFIE, TOI TU ACCOMPLIS.

LECTURE · ~15 MIN

5 étapes pour **anticiper** plutôt que subir.

- | | | |
|-----------|--------------------------------|-------|
| 01 | La projection 14 jours | p. 6 |
| 02 | L'inventaire de capacité | p. 8 |
| 03 | Les buffers intentionnels | p. 10 |
| 04 | Le check-in du dimanche | p. 12 |
| 05 | Les signaux précoces de dérive | p. 14 |

AVANT DE COMMENCER

Ce guide est conçu pour être appliqué cette semaine, pas étudié. Garde un crayon proche — il y a trois exercices courts à faire au fil de la lecture.

Ce n'est pas un problème de discipline.

Si tu jongles plusieurs projets et que tu finis trop de mois en mode urgence, le diagnostic le plus répandu — "je manque de discipline" — est aussi le plus faux.

La plupart des solopreneurs surchargés ne travaillent pas trop peu. Ils travaillent **énormément**. Le vrai problème, c'est qu'ils n'ont aucun moyen de voir leur charge réelle avant qu'elle ne devienne une crise.

Sans système, ton cerveau gère trois tâches en parallèle : faire le travail, te rappeler ce qui reste à faire, et anticiper ce qui s'en vient. Les deux dernières grugent une énergie mentale énorme — et c'est là que le système échoue, pas dans l'exécution.

L'IDÉE CENTRALE

Un deadline qu'on échappe est presque toujours le symptôme d'un trou dans le système, pas d'un trou dans ton calendrier. Le but de ce guide : combler les trous du système pour que les surprises deviennent rares.

Les cinq étapes qui suivent forment un système complet. Tu peux les implanter en une fin de semaine. Mais avant, regardons ce que ça coûte vraiment de continuer sans système.

Ce que la surcharge te coûte vraiment.

Le coût des deadlines qu'on échappe ne se mesure pas en heures supplémentaires. Il se mesure en trois zones plus difficiles à voir — et plus difficiles à réparer.

1

L'anxiété dominicale

Tu sens que tu as oublié quelque chose, mais tu ne sais pas quoi. Le dimanche soir devient une zone grise au lieu d'un moment de récupération.

2

La qualité qui glisse

Tu livres en dernière minute, donc tu livres en dessous de ton standard. Les itérations qui font la différence sont coupées par manque de temps.

3

La confiance qui s'effrite

Chaque "petit retard" gruge la relation client, même quand tu finis par livrer. À long terme, les meilleurs clients partent en silence.


Et le coût de bascule.

Au-delà d'un certain seuil, le coût mental de gérer la surcharge devient supérieur au coût de faire le travail lui-même. C'est le moment où beaucoup de solopreneurs commencent à éviter inconsciemment les nouveaux projets — par peur, pas par stratégie.

La bonne nouvelle : le système qui suit traite les trois symptômes en même temps, parce qu'ils ont tous la même cause. Pas de visibilité.

Cinq étapes. Vingt minutes par semaine.

Voici la structure complète. Chaque étape sera détaillée dans les pages suivantes, mais tu peux déjà voir l'ensemble.



Les étapes 1, 2 et 3 sont des **installations** que tu fais une fois. Les étapes 4 et 5 sont des **rituels** que tu maintiens. C'est cette combinaison — installer puis maintenir — qui rend le système robuste.

La projection 14 jours.

Le problème avec les listes "aujourd'hui / demain", c'est qu'elles te montrent ce que tu vas faire — pas ce qui s'en vient.

Tant que ton horizon de planification se limite aux 48 prochaines heures, tu es structurellement incapable de voir les conflits avant qu'ils explosent. Les deadlines qu'on échappe ne sortent jamais de nulle part. Elles étaient visibles depuis 10 jours, mais ton système ne te les montrait pas.

Comment faire

Liste toutes les tâches engagées sur les 14 prochains jours. Pas en blocs ("projet client X"). Tâche par tâche, avec une date d'échéance précise et une estimation de durée en heures.

L'inventaire doit inclure les engagements externes (livrables clients, réunions, rendez-vous fixes) **et** les engagements internes (admin, facturation, prospection, suivis).

EXERCICE

Ouvre une page blanche. En 10 minutes, écris toutes les tâches en suspens des 14 prochains jours avec leur date butoir. Si tu en oublies pendant l'exercice, c'est exactement le problème que cette étape règle.


Pourquoi 14 jours, pas 7 ni 30

Sept jours, c'est trop court : tu ne vois pas les conflits qui se forment au-delà du vendredi. Trente jours, c'est trop long : tu ajoutes du bruit et de l'incertitude qui rendent le système moins utile, pas plus.

Quatorze jours, c'est la fenêtre où tes engagements sont assez fermes pour être planifiés et assez proches pour que les estimations tiennent.

Ce que tu vois change **tout**.

À gauche, la vue typique d'un solopreneur sans système : la journée d'aujourd'hui, parfois demain. À droite, la projection 14 jours. La différence n'est pas dans le travail à faire — il est identique. La différence est dans **ce que tu peux anticiper**.

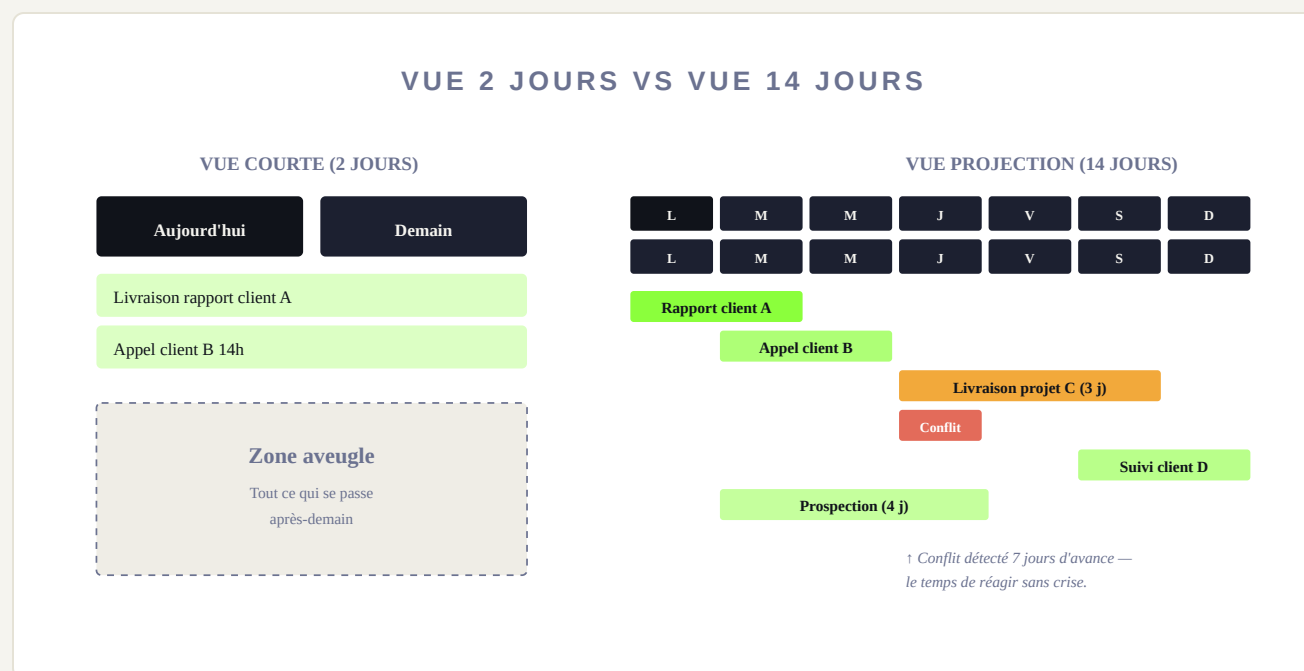

LE DÉCLIC

Ce n'est pas la quantité de travail qui change. C'est ta capacité à voir un conflit 7 jours avant qu'il arrive — et donc à le résoudre calmement, plutôt qu'à le subir.

L'inventaire de **capacité**.

La projection 14 jours te montre ce qu'il y a à faire. Mais ça ne sert à rien si tu ignores combien d'heures tu as **réellement** disponibles pour le faire.

La plupart des solopreneurs surestiment leur capacité productive de 40 à 60 %. Ils comptent leurs heures de travail brut. Mais entre les courriels, les appels imprévus, les transitions entre projets, les pauses cognitives nécessaires et l'admin invisible... il reste rarement plus de 60 % du temps disponible pour le travail livrable.

La règle des 60 %

Pars de tes heures théoriques par semaine. Soustrais 40 %. C'est ta capacité réelle pour le travail livrable.

LE CALCUL DE BASE

40 heures théoriques par semaine (5 jours × 8 h)

– 16 h consacrées à l'admin, aux courriels, aux transitions et aux imprévus

= 24 h réellement disponibles pour les livrables.

Ce chiffre — 24 h — est celui que tu dois utiliser pour planifier ta projection 14 jours. Pas 40. Sinon, tu construis ton plan sur du sable.

Si ça te paraît bas, c'est parce que ça l'est. Et c'est exactement pour ça que la plupart des solopreneurs se retrouvent en mode urgence : ils ont planifié 40 h de travail dans 24 h de capacité réelle.

Où passe ton temps, vraiment.

Une semaine de 40 heures théoriques, décomposée. La portion verte est ce qu'il reste pour le travail livrable — la seule partie qui fait avancer tes projets.

DÉCOMPOSITION D'UNE SEMAINE TYPE

40 h théoriques



LÉGENDE DES 16 H NON-LIVRABLES

- Admin** : compta, facturation, suivi de tâches, paperasse
- Courriels** : réponses, lecture, triage, suivi communications
- Imprévus** : requêtes urgentes, problèmes techniques, urgences clients
- Transitions** : coût cognitif de passer d'un projet à l'autre

EXERCICE

Pendant une semaine, note honnêtement combien d'heures tu passes en travail livrable (pas en travail tout court). Ne triche pas. La plupart des solopreneurs découvrent qu'ils sont à 50 %, pas 60 %.

Une fois que tu as ton chiffre réel, c'est celui-là qui devient ta contrainte de planification. Plus jamais 40 h.

Les buffers intentionnels.

Un buffer, c'est du temps réservé pour **rien**. Ça sonne contre-intuitif. C'est pourtant la pièce qui garde tout le système intact quand un projet dérape — et un projet dérape toujours.

Sans buffers, ton plan est une chaîne. Casser un maillon casse toute la chaîne suivante. Une réunion qui déborde de 30 minutes décale ta journée entière. Un client qui répond en retard repousse trois autres livrables.

Avec buffers, ton plan devient un filet. Une dérape se rattrape dans le buffer le plus proche, sans contaminer le reste.

Trois types de buffers

TYPE 1

Buffer fin de semaine

1 à 2 heures le vendredi après-midi, jamais planifiées. Sert à absorber tout ce qui a glissé pendant la semaine. Si rien n'a glissé, tu pars plus tôt ou tu prends de l'avance.

TYPE 2

Buffer pré-livraison

10 à 15 % du temps estimé d'un livrable, ajouté avant la date prévue. Un projet estimé à 10 heures se planifie sur 11.5 heures. La marge sert aux ajustements de dernière minute et aux retours clients tardifs.

TYPE 3

Buffer de récupération


Un demi-jour par mois, complètement vide. Pas pour rattraper. Pour décompresser, faire le ménage de ton système, ou tout simplement souffler. C'est le buffer qu'on est le plus tenté de couper — et celui qu'il faut le plus protéger.

Ce qui arrive quand un projet glisse.

Même scénario : un livrable client A déborde de 4 heures. À gauche, sans buffer. À droite, avec buffer. La différence n'est pas dans le travail à rattraper — c'est dans **ce qui se passe ensuite**.


EFFET D'UN DÉPASSEMENT DE 4 H

SANS BUFFER



*Effet domino sur 4 jours.
Fin de semaine sacrifiée.
Anxiété + heures supp.*

AVEC BUFFER



*Rattrapage absorbé vendredi.
Aucune autre tâche affectée.
Fin de semaine intacte.*

À RETENIR

Un buffer n'est pas du temps perdu. C'est de l'assurance. Tu paies un petit coût garanti (~10 % de ta capacité) pour éviter un gros coût aléatoire (une semaine en mode crise par mois).

Le check-in du dimanche.

Vingt minutes. Chaque dimanche soir. Trois questions. C'est l'étape qui transforme un plan figé en un système vivant.

Sans rituel hebdomadaire, ta projection 14 jours devient obsolète en quelques jours. Avec, elle reste calibrée en permanence — et c'est cette calibration continue qui fait toute la différence entre un système qu'on subit et un système qu'on pilote.

Les trois questions

01 Qu'est-ce qui a glissé cette semaine ?

Et où ça a atterri. Pas pour te blâmer — pour comprendre. Une tâche qui glisse trois fois de suite n'est pas une tâche qui prend du retard, c'est une tâche mal définie ou mal estimée.

02 Qu'est-ce qui s'en vient dans 14 jours que je n'avais pas anticipé ?

Nouveau projet, courriel reçu, deadline qui s'approche. Ajoute-le à la projection 14 jours et vérifie si ça crée un conflit avec ta capacité.


03 Est-ce que ma capacité réelle a changé ?

Vacances qui s'en viennent, maladie, congé, surcharge persistante. Ta capacité n'est pas constante — ton plan doit refléter ta vraie semaine, pas une semaine fictive.

Pourquoi dimanche soir.

Le moment du rituel n'est pas neutre. Le dimanche soir offre une combinaison unique : juste assez de distance avec la semaine qui finit pour la voir clairement, juste assez de proximité avec le lundi pour que l'ajustement compte.

LA FENÊTRE OPTIMALE



Distance émotionnelle + proximité d'action = clarté maximale

Variante

Si le dimanche soir est sacré pour toi (famille, repos, principe), bascule au lundi matin **avant** de commencer à travailler. Pas pendant la journée. Pas après une réunion. La règle : le check-in doit précéder l'action de la semaine, pas la suivre.

À ÉVITER

Faire le check-in vendredi en fin de journée. Tu es fatigué, tu veux décrocher, tu vas survoler. Le résultat : tu commences la semaine suivante avec un système non-recalibré.

Les signaux **précoces** de dérive.

Un deadline manqué commence à se former dix jours à l'avance. Le problème, c'est qu'on l'ignore — parce qu'on ne sait pas quoi regarder.

Voici les quatre indicateurs qui annoncent qu'un projet est en train de glisser, bien avant que le deadline arrive. Quand un signal s'allume, tu as 48 heures pour réagir avant que ça devienne une crise.

1 SIGNAL CALENDRIER

Trois jours sans avancée mesurable

Pas "trois jours sans travailler dessus". Trois jours sans livrable concret produit. Si tu travailles dessus mais que rien n'avance, c'est un problème de découpage des tâches.

2 SIGNAL ESTIMATION

Temps réel > 30 % de l'estimé

Les premières tâches d'un projet sont les plus prévisibles. Si elles dérapent déjà de 30 %, le reste va déraiper de plus encore. Reprojecte toute la suite.

3 SIGNAL DÉPENDANCE

Réponse externe en attente > 48 h

Client, fournisseur, collaborateur. Au-delà de 48 h sans réponse, tu n'es plus en attente — tu es bloquée. Action : relance proactive ou contournement.

4 SIGNAL ÉMOTIONNEL

Tu commences à éviter le projet

Le plus subtil, le plus fiable. Quand tu choisis systématiquement de travailler sur autre chose, c'est que ton cerveau a déjà détecté un problème. Écoute-le.

QUESTION À SE POSER

Quel est, en ce moment, le projet sur lequel tu as déjà au moins un signal allumé — et que tu n'as pas encore traité ? La réponse arrive en moins de 5 secondes. C'est exactement le projet à recalibrer cette semaine.

Quoi faire dans les 48 heures.

Détecter un signal sans agir, c'est pire que ne rien détecter du tout — parce que ça crée une fausse impression de contrôle. Voici le protocole d'action selon le nombre de signaux allumés sur un même projet.

1 SIGNAL

Reprojette le deadline interne du projet. Pas le deadline externe (client) — le deadline que tu te donnes. Ajoute 20 % de temps. Vérifie que ça tient dans ta capacité de la semaine.

2 SIGNAUX

Action requise : retire ou reporte une autre tâche pour libérer de la capacité. Tu ne peux pas ajouter du temps qui n'existe pas. Quelque chose doit sortir du plan.

3 SIGNAUX OU PLUS

Conversation client immédiate. Pas dans une semaine — maintenant. L'objectif : renégocier le deadline ou le scope avant que le projet entre officiellement en retard. C'est le moment où la franchise coûte le moins cher.

La règle d'or

Une crise détectée 10 jours à l'avance coûte 1 conversation. La même crise détectée 2 jours à l'avance coûte 1 conversation difficile + des heures supplémentaires + une relation client tendue. La même crise détectée au deadline coûte la perte d'un client.

Les signaux précoces ne sont pas un système de prédiction. C'est un système de **réduction de coût**. Tu paies plus tôt, tu paies moins.

Pas besoin d'outil **compliqué.**

Le système a été conçu pour fonctionner avec ce que tu as déjà sous la main. La méthode prime sur l'outil — toujours.

Le minimum vital

Trois choses suffisent pour démarrer cette semaine :

1 Un tableur ou une feuille papier

Pour ta projection 14 jours. Colonnes : tâche, projet, durée estimée, date butoir, statut. Excel, Google Sheets, Numbers, ou un cahier — tous fonctionnent.

2 Un calendrier

Celui que tu utilises déjà. Pour bloquer tes buffers (étape 3) et marquer ton rituel du dimanche (étape 4) comme un rendez-vous récurrent.

3 20 minutes le dimanche

Bloquées dans ton calendrier. Récurrentes. Non-négociables. C'est le seul "outil" qu'on oublie toujours d'installer.

Le piège à éviter

Beaucoup de solopreneurs passent une fin de semaine entière à choisir et configurer l'outil parfait — et n'utilisent jamais la méthode. C'est l'évitement déguisé en productivité.

Démarre avec une simple feuille. Si après deux semaines tu sens que la méthode tient, alors regarde si un outil dédié t'aide. Pas avant.

Quand le système commence à peser.

Le système manuel fonctionne très bien pour 1 ou 2 projets. À partir de 3, quelque chose change — pas dans la méthode, mais dans son coût d'entretien.

Plus tu ajoutes de projets, plus le temps que tu passes à **maintenir le système** grandit non-linéairement. Pourquoi ? Parce que chaque nouveau projet ajoute non seulement son propre coût d'entretien, mais aussi le coût de vérifier sa compatibilité avec tous les projets existants — conflits de ressources, de deadlines, de capacité. À 5 projets, tu maintiens 5 plans mais tu vérifies **10 paires d'interactions potentielles**. C'est cet effet combinatoire qui creuse l'écart.

TEMPS D'ENTRETIEN HEBDOMADAIRE SELON LE NOMBRE DE PROJETS

PROJETS ACTIFS	ENTRETIEN / SEMAINE	CHARGE MENTALE
1 projet	~20 min	Négligeable
2 projets	~45 min	Faible
3 projets	~1 h 15	Modérée
4 projets	~1 h 50	Significative
5 projets ou plus	~2 h 30	Lourde

Pris isolément, 2 h 30 par semaine semble raisonnable. Mais c'est plus de **10 % de tes 24 heures livrables** — consacrées à organiser le travail plutôt qu'à le faire. Et la charge mentale de garder 5 projets en tête, elle, ne se chronomètre pas. Pas un échec de discipline — une limite structurelle du travail solo multi-projets.

On a conçu Vector pour **ce moment précis.**

Quand le système commence à peser plus que ce qu'il apporte, la vraie question n'est plus "comment me discipliner mieux ?", mais "comment automatiser ce que je faisais manuellement ?".

C'est exactement ce que fait Vector. La méthode reste la tienne. L'entretien devient celui de l'IA.

CE QUE FAIT ARTHUR, TON CHIEF PLANNING OFFICER IA

→ **Projection 14 jours**

Construite et tenue à jour automatiquement à chaque ajout de tâche.

→ **Replanification continue**

Chaque fois qu'une tâche bouge, l'ensemble du plan se recalcule.

→ **Signaux détectés**

En continu. Tu reçois une alerte dès qu'un projet entre en zone à risque.

→ **Capacité calculée**

Basée sur ton historique réel, pas sur des estimations théoriques.

→ **Check-in semi-auto**

Arthur prépare le résumé du dimanche, tu valides en 5 minutes.

→ **Tu gardes le contrôle**

L'IA propose, tu valides. Jamais le contraire.

Tu gardes la méthode que tu viens d'apprendre. Tu te débarrasses uniquement du coût de maintenance qui grandit avec chaque nouveau projet.

L'IA planifie. Toi, tu accomplis.

Commence **gratuitement**. Aujourd'hui.

Pas de carte de crédit. Pas de démo à programmer. Tu crées un compte et Arthur commence à travailler avec toi en moins de 10 minutes.

Fondation

0 \$ à vie

2 projets actifs · Briefing hebdomadaire et matinal · Planning automatisé au calendrier · Fonctionnalités de planning IA de base · Pour tester la méthode sans engagement.

RECOMMANDÉ

Accélération

29 \$ / mois

Projets illimités · Rapports · Toutes les fonctionnalités de planning IA · Pour les solopreneurs qui jonglent 3 projets ou plus.

Délégation

79 \$ / mois

Accélération + Chief Operating Officer IA qui exécute · Jusqu'à 2 employés IA dédiés à automatiser tes tâches répétitives · Pour automatiser au-delà du planning.

Propulsion

119 \$ / mois

Délégation + employés IA illimités · Marque blanche · Pour les solopreneurs que plus rien n'arrête.

OFFRE DE LANCEMENT

Inscris-toi pendant la phase bêta et tu reçois **30 jours d'Accélération offerts** en contrepartie d'un feedback dans les 14 premiers jours. Tu accèdes aussi **en priorité aux plans Délégation et Propulsion** avant leur sortie publique, avec une période de gratuité à chacun. L'accès Fondation reste à vie, sans carte requise.

VECTOR.

PROCHAINE ÉTAPE

Arrête de planifier. Commence à accomplir.

Tu as la méthode. Tu peux l'appliquer manuellement dès cette semaine. Ou laisser Arthur s'occuper de tout — pendant que tu te concentres sur le seul travail qui compte vraiment : le tien.

Essayer Vector gratuitement →

vectorplanning.ai
